

INFORME COMETIDO: SALAMANCA *Comisión Salud y Deportes*

04 de junio 2026

GO RTE




GOBIERNO REGIONAL
REGION DE COQUIMBO

CONSEJO REGIONAL



CONTEXTO:

ACUERDOS CORE N°15938 Y 15937 DE
LA SESIÓN ORDINARIA N°869
Y N°15992 DE LA SESIÓN N°871,

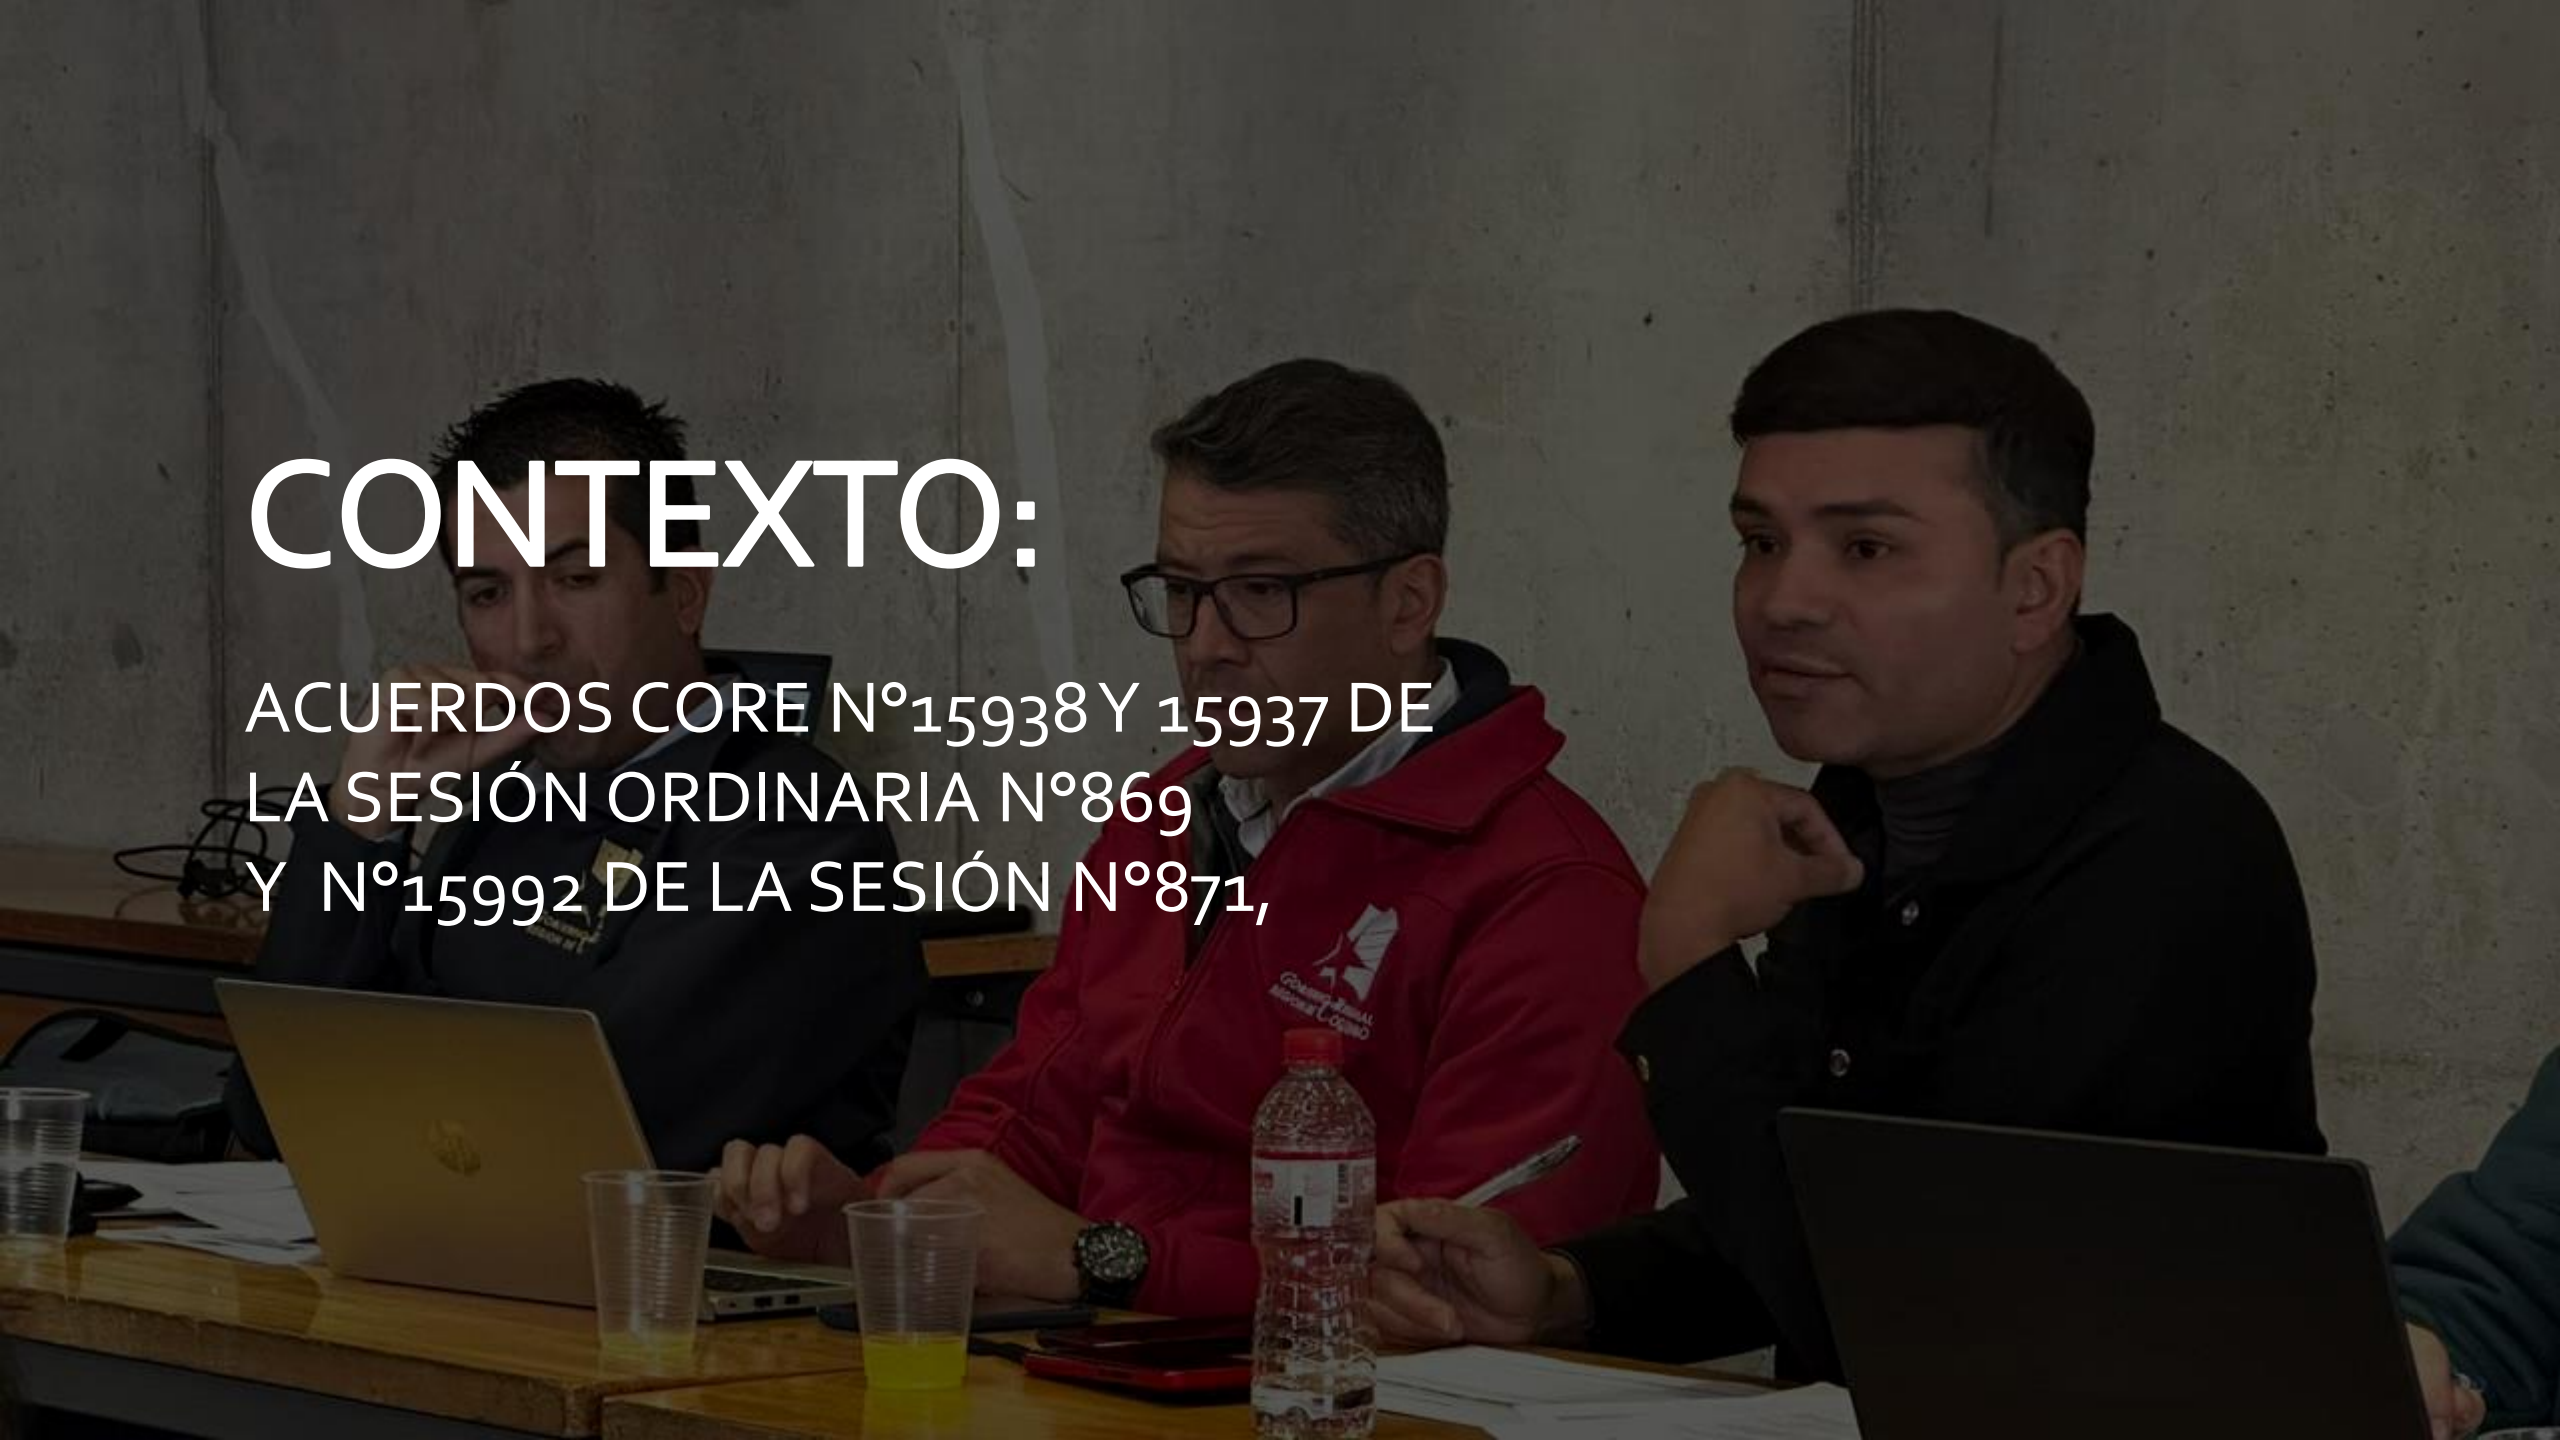

PROGRAMA:

12:00-13:30 HORAS: REUNIÓN ANÁLISIS
ESTADO CARTERA DE SALUD,
LUGAR: AUDITORIO MUNICIPIO DE
SALAMANCA.

INVITADOS: CORE, DIPIR, COMISIÓN SALUD
CONCEJO MUNICIPAL, SSC, SEREMI DE
SALUD.

15:30-16:30 HORAS.: VISITA OBRAS
"MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO EL
TAMBO", SALAMANCA.

LUGAR: EL TAMBO, SALAMANCA
INVITADOS: CORE, DIPIR, MUNICIPIO Y
COMUNIDAD ORGANIZADA.





04 Junio 2016

Cartera de Proyectos Comuna de Salamanca

Servicio de Salud Coquimbo



TRABAJANDO
PARA USTED

- **CONSEJEROS QUE PARTICIPARON DE ESTE PROGRAMA:**
- Juan Barraza, Ángel González, Denis Cortés.
- **ACOMPañAN FUNCIONARIOS:** Renata Guerra, Asesor técnico Core; Marcelo Flores , audiovisual

***SOBRE LOS
RESULTADOS DE
LA AGENDA EN LA
COMUNA
SALAMANCA***



ANÁLISIS CARTERA DE SALUS COMUNA DE SALAMACA

CONTEXTO: Acuerdo CORE N°15992 de fecha 12 de mayo acuerda agendar una reunión con Seremi de Salud, Servicio de Salud de Coquimbo y el municipio de Salamanca, para abordar el estado de la cartera de Salud de esta comuna.

ASISTENTES: Oscar Aguilera Seremi de Salud, Sofía Segura Directora Dirección Salud Municipal (S), Máximo Vega integrante del Cosoc, Pedro Barrio DIPIR, Danilo Tapia DIPIR; Carlos Cepeda Presidente comisión salud Concejo Municipal, Concejales José Peña, Jaqueline Briseño y Manuel Cuevas , Nirma Bugueño Jefe depto Unidad de proyectos y preinversión SSC y Marcela Allard SSC

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- SRA. Nirma Bugueño, expone sobre estado de cartera.
- Concejales, agradecen tener claridad de la situación actual de los proyectos.

ANÁLISIS CARTERA DE SALUS COMUNA DE SALAMACA

Reposición de ambulancias

- Proyecto en ejecución (19 ambulancias regionales, 2 para Salamanca).
- En toma de razón en Contraloría.
- Preocupación por tiempos y brechas de cobertura.
- Propuesta de recambio cada 8 años y alternativa vía Circular 33.

Posta de Salud Rural Cuncumén

- 100% de avance físico, en proceso de habilitación.
- Observaciones técnicas detectadas en visita en terreno.
- Problemas de coordinación con minera Los Pelambres y fundación Levantemos Chile.
- Problema crítico de alcantarillado rechazado (retraso de 4 meses).
- Obra no se ajusta al proyecto aprobado por SEREMI de Salud.

Posta de Salud Rural Llimpo

- Diseño paralizado por término de contrato con privados.
- Problemas de terreno y financiamiento.
- Posible continuidad por minera o financiamiento municipal.

ANÁLISIS CARTERA DE SALUS COMUNA DE SALAMACA

Posta de Salud Rural Tahuinco

- En etapa de formulación.
- Sin ingreso de pertinencia al MINSAL.
- Dificultades por falta de terreno y necesidad de agilizar.

Posta de Salud Rural El Tambo

- Sin avances.
- Requiere regularización de categoría (actualmente EMR).
- Necesidad de iniciar proceso ante MINSAL.

Reposición vehículos rondas médicas

- 5 vehículos en proceso de adjudicación.
- Un oferente y plazo de entrega de 40 días.

Vehículo traslado pacientes dializados

- Con presupuesto asignado.
- Unidad Técnica definida, en etapa de tramitación de convenio.

ACUERDO:

- Fortalecer el seguimiento de la vida útil y la reposición de ambulancias, incorporando criterios de renovación oportuna para evitar brechas en la atención.
- Coordinar acciones entre el municipio, el Servicio de Salud y el Gobierno Regional, para destrabar iniciativas en etapa de diseño o formulación (PSR Llimpo, Tahuinco y El Tambo), incluyendo revisión de terrenos, pertinencias y continuidad de financiamiento.
- Coordinar con la empresa minera Los Pelambres la regularización de proyectos PSR Cuncumén, a fin de avanzar en su habilitación definitiva.
- En futuras invitaciones a representantes de la empresa minera Los Pelambres al Consejo Regional, se incluya también la convocatoria a los concejales y al alcalde de Salamanca
- Oficiar al SSC, solicitando dar agilidad al concurso de Director Hospital de Salamanca.

MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO EL TAMBO EN SALAMANCA

CONTEXTO: Acuerdo N°15938 de fecha 10 de abril, acuerda Programar visita de fiscalización a la iniciativa: "mejoramiento recinto deportivo El Tambo, comuna de Salamanca" .

ASISTENTES:

ASISTEN: representantes de la empresa, Sr. Eleodoro Díaz Dirigente del Club Deportivo, Sra. Juani Rivera Dirigenta de la Asociación de Fútbol, Ariel Molina Secplan Municipalidad Salamanca, Pedro Barrio Dipir y Danilo Tapia DIPIR.

MONTO: \$1.815.678.074 IVA incluido, aportados por el FNDR, adjudicado a CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8, en un plazo de 300 días corridos

DESCRIPCIÓN:

busca realzar diversas áreas, destacando:

Área de Juego (cancha de fútbol): Reposición de la cancha de tierra por una de pasto sintético, Incluye cierre perimetral con diferentes alturas y materiales, Incorporación de 4 torres de iluminación de 18 metros con 9 focos de 500w cada una, Construcción de graderías metálicas (300 butacas), garita de transmisión y cubierta., Mejoramiento general de los espacios existentes.

- Estado de avance de la obra (32% de ejecución).
- Demoras en los estados de pago y revisión del EP N°6.
- Ampliación de plazos del proyecto y adecuación de partidas.
- Problemas de diseño (existencia de dos diseños y superposición de graderías con la cancha).
- Reevaluación del proyecto en coordinación con el IND.
- Impacto económico de la extensión de plazos en la empresa.
- Observaciones nuevas del proyecto (28 pendientes).
- Preocupación de dirigentes por retrasos y uso de la cancha.
- Déficit de butacas en graderías.
- Necesidad de evaluar ajustes o eventuales modificaciones al proyecto.
- Multa cursada a la empresa y presentación de descargos.



ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN.

Mediante Ord. N°2053 de fecha 26/05/2026 el Gobierno Regional informa visación EPN°5 (obras civiles) a la UT por un monto de \$127.971.224. Este estado de pago consideró una multa a la empresa contratista por concepto de 19 días de ausencia injustificada del prevencionista de riesgos en obras por \$4.729.396.

Mediante Ord. N°2135 de fecha 29/05/2026 el Gobierno Regional informa visación EPN°3 (consultorías) a la UT por un monto de \$2.833.333. Pendiente envío por parte de la unidad técnica del estado de pago con su factura correspondiente.

TOTAL, PAGADO A LA FECHA:

Obras civiles \$325.833.566

Consultorías \$ 6.829.981





ACUERDOS:

1. Solicitar al Ejecutivo conformar de una Mesa Técnica liderada por la Municipalidad, a través de Secplan, con el objetivo de resolver oportunamente las observaciones del proyecto y evitar nuevos retrasos, estableciéndose además la participación de un Consejero Regional y la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional, y definiéndose que sus reuniones se realicen los días miércoles, a fin de facilitar la participación de todos los actores involucrados.
2. Solicitar al municipio, a través de Secplan, dar prioridad y agilidad a la tramitación de los estados de pago, una vez presentados por la empresa.
3. Realizar una nueva visita de seguimiento en el mes de agosto, con el fin de revisar el estado de avance de la obra.

OTRO:

Solicitar la realización de una visita a la obra de alcantarillado del sector San Agustín, en la comuna de Salamanca a través de la comisión a cargo de materias de alcantarillado y servicios sanitarios, en coordinación con la comunidad local, el municipio de Salamanca y el Gobierno Regional, con el objeto de conocer el estado de la obra, recoger antecedentes y evaluar eventuales acciones de apoyo.
